

大垣精工株式会社 様

DX推進の伴走支援ご提案

～6ヶ月でDXが回り始める状態を作る～

2026年2月20日

YSソリューションズ 清水 裕

現状課題の理解

DX推進が進まない構造的な要因

人手不足

データセンター増設に伴う
HDD生産量の増加により
人手不足が発生している



個別システム導入

部門単位でのシステム導入
会社全体で連携されない



個別最適のデジタル化は進んでいるが 全体設計と進め方が未整理

紙・用紙による業務

根強く残っている押印文化
紙媒体での申請・承認



DX推進チーム

兼任業務で進め方が不明
DXのための知識不足



ご提案のコンセプト

小さく始め、成功体験を積み上げる



- ◆ すでに複数システムを導入しておりDXの土台は存在している
- ◆ 課題が頭在化している領域から着手する
- ◆ 小さな成功体験を積み上げていく
- ◆ DX推進チームが自走できる状態を作る

DXビジョン設定

入力は1回、集計は自動、判断はデータで

「社内業務を徹底的にデジタルで効率化し、 データを活用することでコスト競争力を高める」

【目標設定】

- ◆ 社内主要業務の電子化率 90%
- ◆ 手作業によるデータ集計の廃止
- ◆ 基幹システム間の主要データ連携の確立

【DX項目成熟度評価】

- ◆ ペーパーレス
- ◆ ノウハウ・ナレッジ共有
- ◆ データ入力一元化
- ◆ 社内コミュニケーション
- ◆ データ集計の自動化
- ◆ システム連携

6ヶ月ロードマップ作成

現状可視化 → 施策実行 → 定着

【6ヵ月後の達成イメージ】

主要業務の課題と進捗が見える化され、一部業務が自動化・電子化され、DX推進チームが自走を開始している状態

【Phase1 : 1～2ヶ月】 DXビジョン共有・現状可視化フェーズ

- DXビジョンの共有・合意
- 重点3領域のヒアリング
- 業務フロー整理
- DX項目成熟度評価
- KPI項目、現状値収集
- 即効改善テーマ選定

【Phase2 : 3～4ヶ月】 ビジョンに直結する施策実行フェーズ

- 即効改善テーマの実装
- データ連携・電子承認の実現
- 業務の自動化
- KPI改善施策の実施

【Phase3 : 5～6ヶ月】 定着・可視化フェーズ

- DX項目成熟度の再評価
- KPI項目の取得
- 効果測定
- 次期フェーズの改善テーマの選定
- 6ヶ月後の結果を経営層と共有

DX推進チームと
進める内容

- ✓ 現状の可視化（ヒアリング）
- ✓ DX推進チームによるプロジェクト推進
- ✓ 課題管理表（Teamsタスク管理）

- ✓ リアルタイム質問、相談窓口（Teamsチーム作成）
- ✓ システム相関図、ネットワーク構成図作成
- ✓ 経営層への報告（定型フォーマット作成）

DX推進チーム伴走支援

DX相談窓口、デジタルを活用したタスク管理

DX推進チームが「何をすればよい
か分かる状態」を作る

★「相談窓口」として Teams を活用

チームメンバー内でリアルタイムな情報共有


後からチーム入りしたメンバーも情報キャッチアップ可能

定期ミーティング（ビデオ会議）、予定管理も可能

★「タスク管理」として Planner を活用

Teamsに統合されたタスク管理ツールを使うことでプロ

ジェクトの課題、対応状況を一元化する

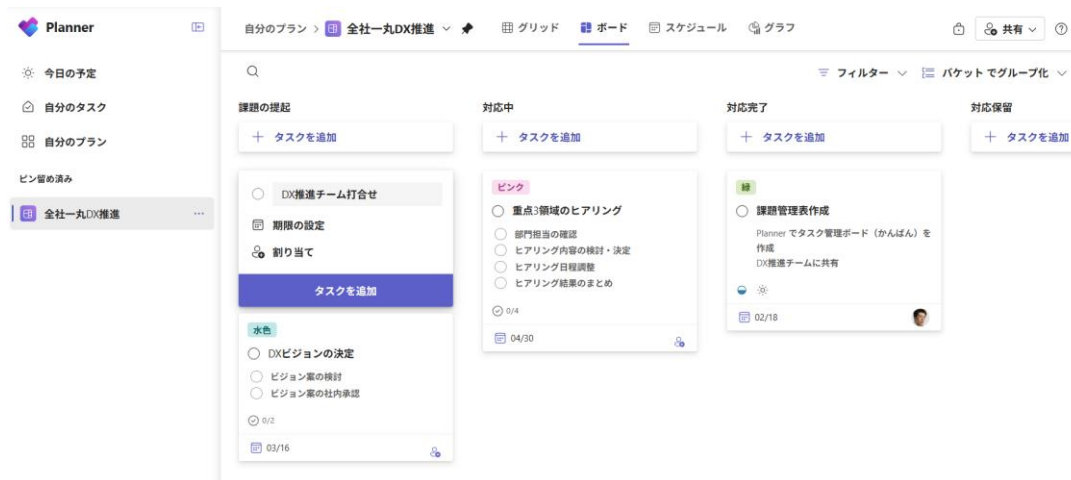

DX進捗の判断について

DXが進んでいると判断できる指標

「社内業務を徹底的にデジタルで効率化し、
データを活用することでコスト競争力を高める」



ビジョンに向かって行く

【成熟度評価】

「DX評価項目」を設定、定期的に項目を評価、集計する
評価者はDX推進チームまたは各部門代表とする

※施策の効果が「DX評価項目」の評価で把握出来る

【KPI測定】

「DX評価項目」の評価につながる項目について目標値を設定する
各項目の数値を定期的に測定する

※施策の進捗効果が「目標値」の達成度で把握出来る

DX進捗の可視化方法 成熟度評価

DX評価項目を定期的に評価

(例)

DX評価項目	評価レベル(1-5)
ペーパーレス	1
データ入力一元化	1
データ集計の自動化	2
システム連携	1
ノウハウ・ナレッジ共有	3
社内コミュニケーション	3


成熟度平均点

1.83

※数値はサンプルです

【レベルの定義】

1. ほぼ未対応
2. 一部対応
3. 部署単位で対応
4. 全社標準化
5. 自動化・連携済み

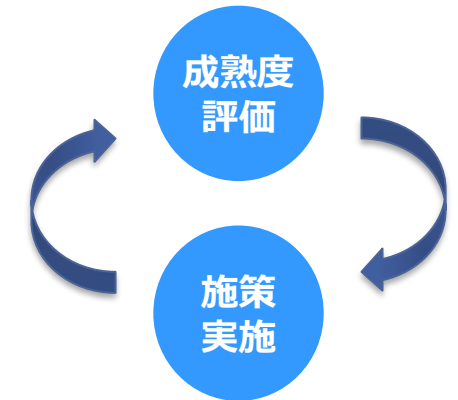

1. 定期的にDX推進チームまたは全社員でDX評価項目について成熟度の平均点を集計する
2. ロードマップの施策を実施する
3. 施策実施後にDX評価項目の評価を行い、DX成熟度の平均点の推移を確認する

DX進捗の可視化方法 KPI（定量指標）

改善効果を定量指標で測定、共有

■ 目標設定の例

【1年目の目標設定】


- 紙申請件数を50%削減
- 二重入力件数を30%削減
- 月次締め日数を30%短縮
- 主要2システムのデータ連携を実現

【中期の目標設定（3年イメージ）】

- 社内主要業務の電子化率 90%以上
- 手作業によるデータ集計の原則廃止
- 基幹システム間の主要データ連携を確立

■ KPI（定量指標）の例

- 月次締め日数
- 紙申請件数
- 二重入力件数
- 手作業集計時間
- システムの自動連携数

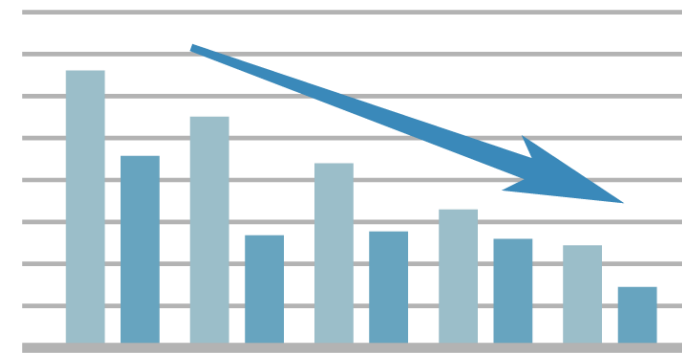

※ KPI値 は可能な限り自動取得する

※ KPI値 の集計、グラフ化もなるべく自動化する

重点3領域のヒアリング

まず成果を出すための対象範囲として「製造」、「会計」、「DX推進チーム」のヒアリング

製造・会計・経費精算

- 仕入データの発生場所
- 在庫評価金額の管理方法
- 売上データの管理方法
- 仕訳の入力方法（手入力、CSV、連携）
- 月次決算の締めに要する日数
- 楽楽精算の仕訳データ作成
- 楽楽精算から会計への連携方法

ヒアリング項目（共通）

- 現状のシステムフロー
- 導入、運用中のシステム
- Excelを使用した業務の有無
- システム・紙などへの二重入力業務の有無
- 手作業での業務の有無
- 困っている点（不効率、作業量大）
- 数値化できそうな指標（数量、時間量、件数など）

即効改善テーマ（例）

すぐに効果が出せると予想している改善テーマ

1. TECHS → 会計 データ連携による会計担当者の業務効率化

- スクリプトのスケジュール実行で仕入、売上データなどを自動的に抽出
- 会計システムに取り込めるCSVとして指定フォルダに自動保存

2. 楽楽精算 → 会計 API連携による会計担当者の業務効率化

- スクリプトのスケジュール実行で旅費・経費精算データを自動的に抽出
- 会計システムに取り込めるCSVとして指定フォルダに自動保存

3. 社内ドキュメント保存場所の統合およびAI検索活用計画作成

- 社内規程、ISOドキュメント、技術的なノウハウドキュメントを1つの保存場所に集約
- 自然言語でキーワード、ドキュメント、社内ルールなどをAIに質問、回答を得るシステム導入

中期ロードマップ（7ヶ月目以降）

優先順位課題を見直しながらDX施策の高度化

6ヶ月ロードマップの延長線で検討、社内合意した「DXビジョン」に向かって

- ◆ 6カ月の活動結果を経営層に報告
- ◆ 「成熟度評価」の結果、タスク管理の課題項目をもとに次期の優先対応課題を決定
- ◆ 社内合意を段階的にDX対応を高度化していく

■ 対応課題の例

- ・ データ連携範囲の拡張（月次決算の早期化など）
- ・ 申請ワークフローのデジタル化（押印文化からデジタル文化へなど）
- ・ 情報セキュリティ強化（データ漏洩対策、ランサム対策、規程整備など）
- ・ 経理業務の効率化（送受信請求書電子化など）
- ・ AI活用全社展開（Microsoft 365 AI活用など）
- ・ IT業務の効率化（アカウント管理、端末管理、システム維持など）
- ・ 業務標準化、マスタ整備（紙媒体からデジタル化、活用など）



伴走支援できる理由

これまでの経験・知識・実績からの提案

1. 製造業での勤務経験

- ✓ 量産部門の製造ライン、品質管理、品質保証での勤務
- ✓ 海外工場立上げ、ドイツ系企業の管理部門での勤務

2. システム導入、運用の実績

- ✓ 生産管理システム（TECHS-S） 導入・運用・改善
- ✓ 会計システム（SMILE）の導入・運用、仕訳データの自動連携
- ✓ 経費精算の楽楽精算の導入・運用

3. マネジメントシステムの構築経験

- ✓ ISO9001 取得プロジェクトの主導（海外、国内）
- ✓ 情報セキュリティ体制の導入（ポリシー制定、規定作成、運用展開）

4. 業務自動化の推進経験と知識

- ✓ クラウドサービスと社内システムのデータ連携
- ✓ RPA、API、AIを活用した業務自動化



YSソリューションズ
info@solutions-ys.com
